


CETAC Servicios

Estatus Semanal

<08/10/2021>

Avance del proyecto (Sprint 1)

Lunes 04/10/21 - Viernes 08/10/21

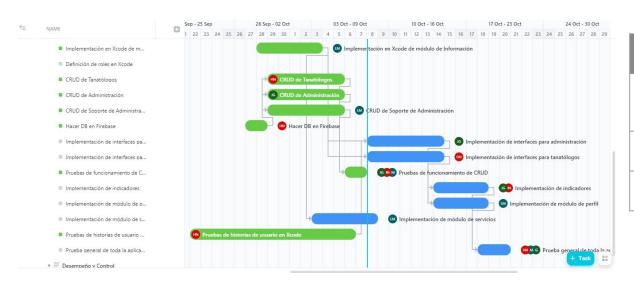

63% Terminado del Proyecto

Objetivos a Futuro

Implementación de los CRUDs al XCode General

Pruebas de historias de usuario

Implementación de indicadores en la app

Avance del proyecto

Lunes 04/10/21 - Viernes 08/10/21

Tareas realizadas en esta semana

Nombre Tarea	Rol responsable	Comienzo Tentativo	Final Tentativo	Aprox. de horas de trabajo
Arquitectura Aplicativa	Diseñador	23/09/21	01/10/21	7 hrs
Funciones del MockUp en Xcode	Programador	20/09/21	03/10/21	10 hrs
Seguridad en Aplicación	Programador	27/09/21	06/10/21	5 hrs
Implementación de roles de usuario en la aplicación	Analista	20/09/21	05/10/21	3 hrs
Aplicación de Pruebas	Programador	04/10/21	08/10/21	3 hrs

Avance del proyecto


Lunes 04/10/21 - Viernes 08/10/21

Tareas realizadas esta semana/Tareas a realizar

Nombre Tarea	Rol responsable	Comienzo Tentativo	Final Tentativo	Aprox. de horas de trabajo
Diseño en XCode de módulo Información	Diseñador	28/09/21	03/10/21	8 hrs
CRUD de roles en app	Programas en Backend	29/09/21	05/10/21	10 hrs
Base de Datos en Firebase	Programador	27/09/21	28/10/21	3 hrs
Interfaces para admin	Programador	08/10/21	14/10/21	7 hrs
Interfaces para soporte de admin	Programador	08/10/21	14/10/21	7 hrs
Interfaces para tanatólogos	Programador	08/10/21	08/10/21	7 hrs

Resumen de Recursos



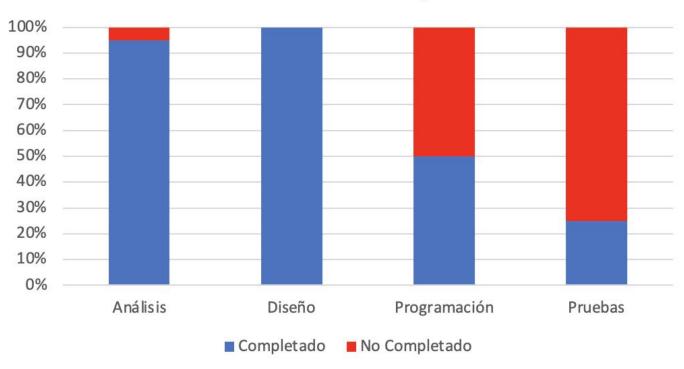

Actualización Semanal – Proyecto X



Etapa	Real	Planeado
Implementación de módulo de información	85%	100%
Implementación de módulo de servicios	95%	100%
Pruebas en Xcode de historias de usuario	50%	100%
Firebase en Xcode	100%	100%
Implementación de gráficas para tanatólogo y administrador	0%	30%
Actualización de documentos PMO	70%	80%
Plan de trabajo actualizado	90%	100%

Actividades

Actividades realizadas	Siguientes Pasos	Dependencias	Riesgos	Plan de mitigación
 Plan de trabajo Plan de gestión de riesgos Pruebas TDD Implementación de CRUD en todos los usuarios Creación del Xcode final Conexión de base con app Actualización semanal de documentos PMO 	 Finalización de creación de pantallas CRUD completo Avance en las gráficas Aseguramiento de calidad Implementación de indicadores Actualización de documentos PMO Implementar validación de datos 	 Base de datos Aprendizaje en Swift Disponibilidades 	 Base de datos no funcional. Retroalimentaci ón tardía Fallas en el servidor de la base Fallas en la implementación en el dispositivo final 	Consultar a profesores para dudas.
