

CETAC Servicios


Estatus Semanal

<09/09/2021>

Avance del proyecto (Sprint 1)

Lunes 09/08/21 - Jueves 09/09/21

Ciclo de Vida del Proyecto	Porcentaje de Completo
Definición y Planeación	75%
Ejecución	67%
Desempeño y Control	0%



Objetivos a Futuro
Funciones en Aplicación
Base de Datos
Aplicación de Pruebas
Arquitectura Aplicativa
Aplicación completamente en Xcode

Avance del proyecto


Lunes 20/09/21 - Miércoles 20/10/21

Tareas a realizar en siguientes Sprints

Nombre Tarea	Rol responsable	Comienzo Tentativo	Final Tentativo	Aprox. de horas de trabajo
Funcionamiento Base de Datos	Programador Backend	20/09/21	30/09/21	8 hrs
Arquitectura Aplicativa	Diseñador	23/09/21	01/10/21	7 hrs
Funciones del MockUp en Xcode	Programador	20/09/21	03/10/21	10 hrs
Seguridad en Aplicación	Programador	27/09/21	06/10/21	5 hrs
Implementación de roles de usuario en la aplicación	Analista	20/09/21	30/09/21	3 hrs
Aplicación de Pruebas	Programador	04/10/21	08/10/21	3 hrs

Resumen de Recursos

Estatus de Trabajo

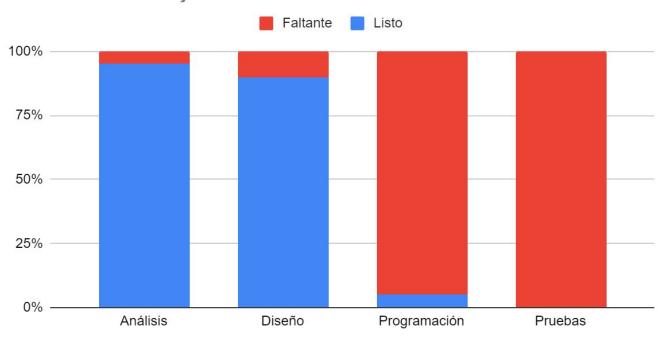

Estátus de Trabajo

Actualización Semanal – Proyecto X



Etapa	Real	Planeado
Definición del proyecto	100%	100%
Diseño del Mockup	100%	80%
Documento de requerimientos	100%	100%
Historias de usuario	100%	100%
Desarrollo del módulo de información	10%	90%
Desarrollo del módulo de expedientes	10%	90%
Desarrollo de la base de datos	70%	100%
Desarrollo del módulo de usuarios	10%	100%

Actividades

Actividades realizadas	Siguientes Pasos	Dependencias	Riesgos	Plan de mitigacion
Plan de trabajo Requerimientos funcionales y no funcionales Plan de gestión de riesgos Desarrollo de Mock Up	Implementación de base de datos. Desarrollo de funcionalidades de la App Pruebas unitarias Aseguramiento de calidad	Validación de Mock Up. Aprendizaje en Swift.	Swift no se adapta a nuestra planeación.	Reuniones cada 2 días para discutir lo que necesitamos. Consultar a profesores para dudas. Consultar al socio formador para claridad.
