


CETAC Servicios

Estatus Semanal

<01/10/2021>

Avance del proyecto (Sprint 1)

Lunes 27/09/21 - Viernes 01/10/21

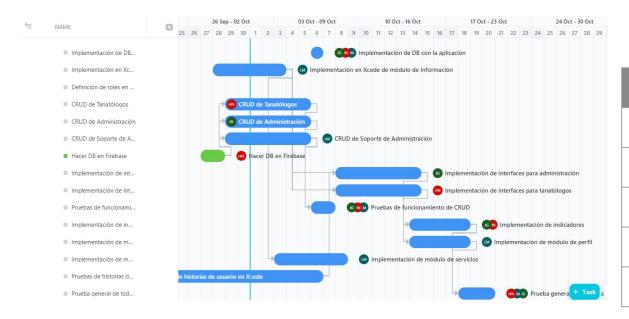

Objetivos a Futuro

Implementación de los módulos en Xcode

Firebase sirviendo con Xcode

Implementación de los CRUDs

Pruebas de historias de usuario

Implementación de indicadores en la app

Avance del proyecto

Lunes 27/09/21 - Viernes 01/10/21

Tareas a realizar para sig. semanas

Nombre Tarea	Rol responsable	Comienzo Tentativo	Final Tentativo	Aprox. de horas de trabajo
Arquitectura Aplicativa	Diseñador	23/09/21	01/10/21	7 hrs
Funciones del MockUp en Xcode	Programador	20/09/21	03/10/21	10 hrs
Seguridad en Aplicación	Programador	27/09/21	06/10/21	5 hrs
Implementación de roles de usuario en la aplicación	Analista	20/09/21	05/10/21	3 hrs
Aplicación de Pruebas	Programador	04/10/21	08/10/21	3 hrs

Avance del proyecto


Lunes 27/09/21 - Viernes 01/10/21

Tareas a realizar para sig. semanas

Nombre Tarea	Rol responsable	Comienzo Tentativo	Final Tentativo	Aprox. de horas de trabajo
Diseño en XCode de módulo Información	Diseñador	28/09/21	03/10/21	8 hrs
CRUD de roles en app	Programas en Backend	29/09/21	05/10/21	10 hrs
Base de Datos en Firebase	Programador	27/09/21	28/10/21	3 hrs
Interfaces para admin	Programador	08/10/21	14/10/21	7 hrs
Interfaces para tanatólogos	Programador	08/10/21	08/10/21	7 hrs

Resumen de Recursos

Estatus de Trabajo

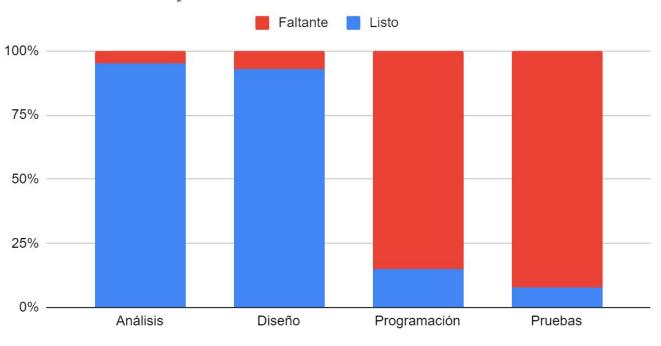

Estátus de Trabajo

Actualización Semanal – Proyecto X



Etapa	Real	Planeado
Implementación de módulo de información	40%	100%
Implementación de módulo de servicios	40%	100%
Pruebas en Xcode de historias de usuario	50%	100%
Firebase en Xcode	80%	100%
Implementación de gráficas para tanatólogo y administrador	0%	30%
Actualización de documentos PMO	70%	80%
Plan de trabajo actualizado	90%	100%

Actividades

Actividades realizadas	Siguientes Pasos	Dependencias	Riesgos	Plan de mitigación
 Plan de trabajo 	 Implementación de base de datos 	Base de datosAprendizaje en Swift	Base de datos no funcional.Retroalimentaci	Reuniones cada 2 días para discutir lo que
Plan de gestión	• XCode		ón tardía	noositarios.
de riesgos	funcionalidad de botones			Consultar a profesores para dudas.
Pruebas TDD	Pruebas unitarias			
 Validación de Mock Up 	Aseguramiento de calidad			Consultar al socio formador para claridad.
Base de datos enFire Base.Actualización	Implementación de indicadoresActualización de			
semanal de documentos PMO	documentos PMO			
